



Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Bytterecká 2180, 026 80 Dolný Hubín

ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA 4

**Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy –
Žaškov, Párnica, Oravská Poruba,
Veličná**

za obdobie 08/2022 – 10/2022



SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVAK ENVIRONMENT
AGENCY



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia
Európske štrukturálne
a investičné fondy

Projekt:

„Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín. Druh projektu – dopytovo orientovaný.

Základné údaje:

Kód projektu:

310011A105

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1

Prioritná os:

Udržateľné využívane prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita:

Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ:

Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:

Slovenská agentúra životného prostredia

Prijímateľ pomoci:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Časové väzby:

Začiatok výstavby: 12/2021

Koniec výstavby: 12/2023

Celkové oprávnené výdavky:

17 694 957,18 €

Nenávratný finančný príspevok:

15 925 461,46 €

Vlastné zdroje Prijímateľa:

1 769 495,72 €

Zhotoviteľ stavby:

Združenie „ORAVA VSCVH“:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Bratislava

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Banská Štiavnica

VÁHOSTAV – SK, a.s.

Bratislava

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Bratislava

Stavebný dozor:

G – Consult - Ing. Vladimír Gejdoš, Šaľa - HIS

GeMaDe, s.r.o. – Ing. Eugen Dedinský, Nižná - ASD

Realizované stavebné objekty:

SS.01 Žaškov, kanalizácia

SS.02 Párnica, kanalizácia

SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač

SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač

Dňa **09.11.2021** bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru a Zmluvu o poskytnutí služieb asistenta stavebného dozoru.

Dňa **07.12.2021** bola podpísaná **zmluva** so zhotoviteľom stavby **na výkon stavebných prác a dňa 08.12.2021 nadobudla Zmluva o Dielo účinnosť.**

Stavebný dozor v zmysle čl. 8.1. Všeobecných zmluvných podmienok vyhlásil začiatok stavebných prác na Diele „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ na **21.12.2021.**

Dňa **22.02.2022** OVS, a.s. - Objednávateľ stavebných prác, oficiálne odovzdal Stavenisko Zhotoviteľovi – združeniu „ORAVA VSCVH“.

Práce na projekte v sledovanom období:

SS.01 Žaškov, kanalizácia

V sledovanom období bolo položených 2 879,02 m kanalizačného potrubia. Vybudované boli vetvy: A, A1,A2, A3,B, B2,B2-1, B3, B4, B5, B6, B13, C, B8, B9, B12, B12-1. Budovaných bolo 77 ks kanalizačných prípojok kanalizačných prípojok k rodinným domom, čo predstavuje 502m.



Obr. 1: Hutnenie ryhy v miestnej komunikácii v obci Žaškov (SS.01)

K dátumu 31.10.2022 je položených 6 085,54 m kanalizačného potrubia z celkových 10 746 m (uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje **56,63%** kanalizačného potrubia v obci Žaškov. V závere sledovaného obdobia boli ukončené stavebné práce v štátnych komunikáciách, bola prevedená dočasná úprava asfaltovaním a absolvovali sme obhliadku so správcom komunikácií pred zimnou údržbou.

Operatívne boli riešené aj zmeny v trasovaní budovanej kanalizácie v záujme vlastníckych práv občanov. Zvolané boli rokovania, kde sa hľadali schodné riešenia.



Obr. 2: Budovanie kanalizácie - stavebné práce v ceste III. triedy v obci Žaškov (SS.01)



Obr. 3: Uloženie kanalizačného potrubia, zásyp a hutnenie v obci Žaškov (SS.01)

SS.02 Párnica, kanalizácia

V sledovanom období bolo položených 1 460,33 m kanalizačného potrubia. Budované boli vetvy: A, B, B2, B2-1, B2-2, B2-3, C, C1, C2, C4, C4-1. Vybudovaných bolo 105 ks kanalizačných prípojok k rodinným domom, čo predstavuje 421,38m.

V sledovanom období boli z ukončené stavebné práce v štátnych cestách. Bola prevedená dočasná úprava asfaltovaním a príprava na zimnú údržbu.



Obr. 4: Stavebné práce v štátnej ceste I/70 v obci Párnica (SS.02)

V závere sledovaného obdobia je položených 4 664m kanalizačného potrubia z celkových 7 757,5 m (uvažované bez kanalizačných prípojk), čo predstavuje **60,13%** kanalizačného potrubia v obci Párnica.

Súčasťou stavebných prác bola aj preložka dažďového odvodnenia v celkovej dĺžke **55,44 m**, ktoré bolo odhalené pri trasovaní stoky B6. Preložených bolo aj 264,39 m verejného vodovodu, ktorý bol v kolízii s trasovanou kanalizáciou, stokou C4.



Obr. 5: Dažďové odvodnenie objavené počas realizácie technológie pretlaku kanalizačného potrubia, stoka „B6“ v obci Párnica (SS.02)

V závere sledovaného obdobia boli ukončené stavebné práce v štátnych cestách. Bola prevedená dočasná úprava asfaltovaním a príprava na zimnú údržbu.



Obr. 6: Dočasná úprava štátnej cesty I/70 v obci Párnica (SS.02)

SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač

V sledovanom období na stavebnom súbore SS.05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač neprebíhali. V súčasnosti je položených 3 690m z celkových 3 719m, čo predstavuje **99,2%**. Zostáva dobudovať 29 m potrubia vrátane osadenia tlmiačich a kalníkových šácht.



Obr. 7: Stavebné práce - kanalizačný zberač SS.05: osadená vzdušníková šachta


Územím s vybudovaným úsekom kanalizačného zberača prebehla biologická rekultivácia, uvedenie do pôvodného stavu a vyčistenie škody, ktorá nastala jednotlivým užívateľom poľnohospodárskej pôdy.

SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač

Stavebné práce na stavebnom súbore začali prebiehať v mesiaci 10/2022 v smere od Dolného Kubína. Položených bolo 347,82 m kanalizačného potrubia, čo predstavuje 12,98%.



Obr. 8: Vytýčená trasa kanalizačného potrubia PP DN400, stoka A (SS.07) a stiahnutá ornica

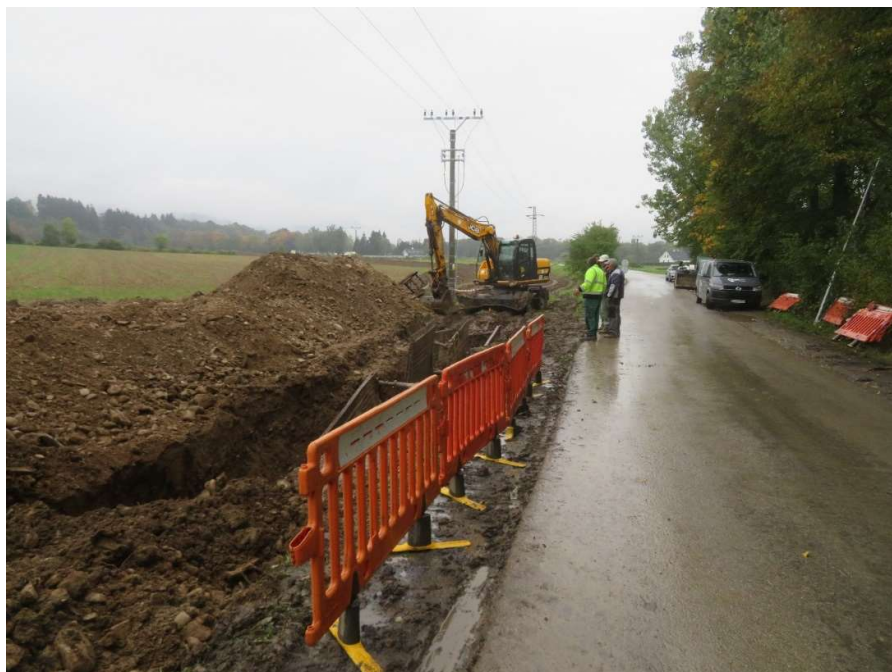

Obr. 9: Výkop ryhy pre uloženie kanalizačného potrubia PP DN400, stoka A (SS.07)

Časť Diela vybudovala OVS, a.s.:

Rozhodnutím MŽP SR zo dňa 21. 03. 2016 bola žiadosť o NFP neschválená. Dôvodom neschválenia bol nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených v rámci výzvy.

Na základe týchto skutočností Oravská vodárenská spoločnosť v roku 2016 rozhodla, že bude práce realizovať z vlastných zdrojov. Výstavba časti diela (**výtlačné potrubie SS.07 Oravská Poruba-Dolný Kubín, kanalizačný zberač**) začala v **07/2017**. Projekt bol budovaný v zmysle stavebného povolenia a dokumentácie pre stavebné povolenie. Položených bolo 986m výtlačného potrubia. Z uvedeného vyplýva, že v závere sledovaného obdobia je **SS.07 Oravská Poruba-Dolný Kubín, kanalizačný zberač** vybudovaný na **49,34%** projektovanej dĺžky kanalizačného potrubia.

Čerpace stanice (ČS):

V sledovanom období boli aktualizované stanoviská SSD k NN pripojeniam jednotlivých ČS a ich odborným miestam. Uzatvorené boli zmluvy o pripojení zariadení užívateľa do distribučnej sústavy, na základe ktorých v nasledujúcom období pristúpime k realizácii NN pripojení jednotlivých ČS.

Prestavanosť jednotlivých stavebných objektov Diela k 11/2022:

- SS.01 Žaškov - 56,63%
- SS.02 Párnica - 60,13%
- SS.05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač - 99,2%
- SS.07 Oravská Poruba - Dolný Kubín, kanalizačný zberač - 49,34%

V závere sledovaného obdobia je vybudovaných 66,36% dĺžky kanalizačného potrubia na diele „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“.

V Dolnom Kubíne, dňa 16.11.2022

Ing. Zuzana Klimeková
