

Projekt:

„Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov prijímateľa Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín.

Štvrtročná správa č. 09 za obdobie 09/2015 – 11/2015

Základné údaje o projekte:

Prioritná os:

1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd



Osadenie čerpacej stanice odpadových vôd v obci Vavrečka.

Operačný cieľ:

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prijímateľ pomoci:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Projekt nadväzuje na I. etapu projektu, ktorá bola ukončená 31. 08. 2009. Dňa 26. 08. 2010 bola podaná žiadosť

o nenávratný finančný príspevok a dňa 14. 11. 2012 Európska komisia schválila veľký projekt odkanalizovania regiónu Oravy „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“ Ide o projekt financovaný z Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) pod Ministerstvom životného prostredia. Realizáciou projektu bude na novú kanalizačnú sieť napojených **18 801** obyvateľov zo 7 obcí **Vavrečka, Hruštín, Zákamenné, Novoť, Rabča, Oravská Polhora a Sihelné**. Odpadové vody od týchto producentov budú čistené na už vybudovanej ČOV Námestovo, ktorá bola vybudovaná v rámci prvej etapy projektu aj pre producentov etapy II. a ostatných obcí okresu Námestovo. V rámci projektu sa vybuduje **127,207** km gravitačnej kanalizácie, **15 ks** čerpacích staníc odpadových vôd a **9,093** km výtlačného kanalizačného potrubia. Zároveň sa zrekonštruujú existujúce čistiarne odpadových vôd v **Dolnom Kubíne** (23 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Dolný Kubín a príslušných obcí a **ČOV v Nižnej n. Oravou** (26 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Trstená a príslušných obcí.



Dočasná úprava ryhy v štátnej ceste III. tr. v obci Krušetnica. Následne bude po jej vybratí prevedená provizórna úprava asfaltovými zmesami.



Konečná úprava ryhy na miestnych cestách v obci Vavrečka.

Stav prác na projekte:

Administratívny pokyn (dátum začatia plnenia zmluvy) bol vydaný dňa 12. 09. 2013. Dňa 24. 09. 2013 je oficiálny termín začatia prác a služieb stavebného dozoru.

K termínu 11/2015 bol vybudovaný nasledovný rozsah stavby:


Aktivita I. Kanalizácia:

Prestavanosť na objektoch kanalizácie bola k obdobiu 11/2015 v dĺžke **125 300,0 m** čo z celkovej dĺžky 136 300 m predstavovalo plnenie **92 %**. Uvedený

rozsah 125 300 m však obsahuje aj odhadovaných 4 km kanalizácie v stave aktuálnej rozpracovanosti. Postup prác predstavuje cca 4,1 km za mesiac. Prestavanosť na ČOV Dolný Kubín predstavuje k sledovanému obdobiu **99 %** a na ČOV Nižná n. O. je to **97 %**. Celková finančná prestavanosť je **80,05%** na stavebných prácach a **87%** na službách stavebného dozoru.

K termínu 11/2015 bola zhotoviteľom stavby predložená faktúra č. 20 za fakturované obdobie 01. 10. 2015 až 31. 10. 2015 v celkovej sume vykonaných prác vo výške 29 323 606,13. Stavba je finančne a fyzicky v sklze a zmluvný termín ukončenia stavby resp. ukončenie stavby do konca roku 2015 je ohrozený. Posilnením kapacít zhotoviteľa a zlepšením výkonov je však možné termín ukončenia stavby do 12/2015 dodržať. Na stavbe ostáva ešte značné množstvo dokončovacích prác ako napríklad kanalizačné prípojky, prechody tokov, asfaltárske práce, úpravy pozemkov atď. Taktiež výstavba čerpacích staníc odpadových vôd je v sklze. Na stavbe sa taktiež vyskytujú miestami lokálne nedostatky v kvalite stavby. Na obidvoch čistiarnach odpadových vôd ČOV Dolný Kubín a ČOV Nižná nad Oravou sa ukončujú posledné práce.

Osadenie technológie - vzduchových potrubí pre prevzdušňovacie platne druhého monobloku na ČOV Nižná n. Oravou.

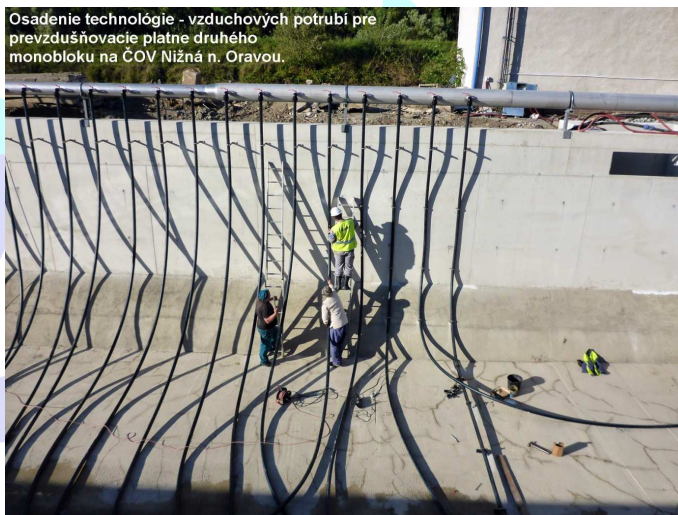

Nový mechanický stupeň na ČOV Nižná n. Oravou.

Aktivita III. ČOV Dolný Kubín:

K obdobiu 11/2015 prebiehali nasledovné práce: Prebieha už iba odstraňovanie vád a nedorobkov. ČOV pracuje v režime skúšobnej prevádzky. Celý objekt čistiarne odpadových vôd je v záverečných štádiách výstavby kde sú hlavné funkčné celky v prevádzke a prebieha hlavne odstraňovanie vád a nedorobkov a realizácia súvisiacich pridružených prác. ČOV Dolný Kubín v režime skúšobnej prevádzky od 30. 04. 2015.

Výkop ryhy v štátnej ceste I. tr. v obci Rabča.
Pokládka kameninového potrubia v telese cesty.



Aktivita IV. ČOV Nižná n. Oravou:

K obdobiu 11/2015 prebiehali nasledovné práce:

Prebieha už iba odstraňovanie vád a nedorobkov. ČOV pracuje v režime skúšobnej prevádzky. Celý objekt čistiarne odpadových vôd je v záverečných štádiách výstavby kde sú hlavné funkčné celky v prevádzke a prebieha hlavne odstraňovanie vád a nedorobkov a realizácia súvisiacich pridružených prác. ČOV Nižná v režime skúšobnej prevádzky od 05. 05. 2015.

Služby stavebného dozoru:

Na stavbe pracujú 8 stavební dozori. 1x vedúci stavebných dozorov, 5x stavebný dozor pre kanalizáciu, 2x stavebný dozor pre ČOV Dolný Kubín a ČOV Nižná. K dátumu 11/2015 bola predložená faktúra č. 8 za obdobie 07 – 09/2015. V danom období sa využívali aj služby špecialistov, 1x elektrotechnický inžinier, 1x geodet stavby, 1x strojnotechnologický inžinier a 1x rozpočtár. Stavebný dozor predložil k 09/2015 faktúry č. 1 až č. 8 vo výške 1 600 980,0 € čo predstavovalo finančnú prestavanosť 86,8 %.




Osadenie čerpacej stanice odpadových vôd ČS III. Krušetnica.
Debnenie a armovanie stien podzemnej nádze.



Výkop kanalizácie v štátnej ceste III. tr. v obci Sihelné.

Ukončená kanalizácia a konečná úprava miestnej komunikácie.
Nový asfaltový koberec na celú šírku cesty v obci Zákamenné.

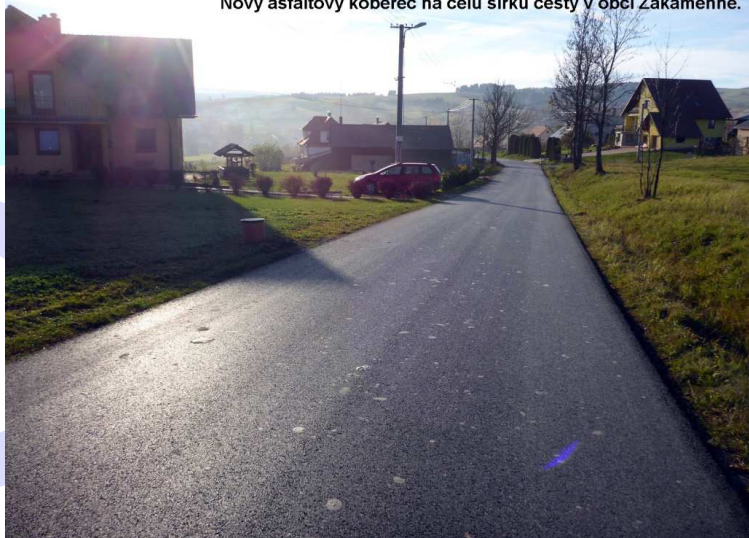

Osadenie podzemnej čerpacej stanice odpadových vôd ČS IV. v obci Zákamenné.
