



Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Bytterecká 2180, 026 80 Dolný Hubín

ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA 2

**Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy –
Žaškov, Párnica, Oravská Poruba,
Veličná**

za obdobie 02/2022 – 04/2022



SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVAK ENVIRONMENT
AGENCY



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia
Európske štrukturálne
a investičné fondy

Projekt:

„Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín. Druh projektu – dopytovo orientovaný.

Základné údaje:

Kód projektu:

310011A105

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1

Prioritná os:

Udržateľné využívane prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita:

Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ:

Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:

Slovenská agentúra životného prostredia

Prijímateľ pomoci:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Časové väzby:

Začiatok výstavby: 12/2021

Koniec výstavby: 12/2023

Celkové oprávnené výdavky:

17 694 957,18 €

Nenávratný finančný príspevok:

15 925 461,46 €

Vlastné zdroje Prijímateľa:

1 769 495,72 €

Zhotoviteľ stavby:

Združenie „ORAVA VSCVH“:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Bratislava

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Banská Štiavnica

VÁHOSTAV – SK, a.s.

Bratislava

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Bratislava

Stavebný dozor:

G – Consult - Ing. Vladimír Gejdoš, Šaľa - HIS

GeMaDe, s.r.o. – Ing. Eugen Dedinský, Nižná - ASD

Realizované stavebné objekty:

SS.01 Žaškov, kanalizácia

SS.02 Párnica, kanalizácia

SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač

SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač

Práce na projekte v sledovanom období:

Dňa **22.02.2022** OVS, a.s. - Objednávateľ stavebných prác oficiálne odovzdal Stavenisko Zhotoviteľovi – združeniu „ORAVA VSCVH“ a dňa **31.03.2022** bola stavba slávnostne zahájená.



Obr.1: Slávnostné zahájenie stavby – poklepanie základného kameňa

V týchto dňoch už prebiehali práce v teréne, ako vytýčenie stavby, vytýčenie inžinierskych sietí, zabezpečovanie materiálového a strojového vybavenia, osadenie dočasných pútačov a iné. V záujme zabezpečenie čo najlepšej informovanosti obyvateľstva v obciach, kde je budovaná verejná kanalizácia boli okrem dodaných plagátov, letákov a propagačných materiálov realizované aj verejné hovory a to dňa **02.03.2022**.




Obr. 2: Billboard – osadený pri ČOV Dolný Kubín



Obr.3: Verejný hovor v obci Párnica a Žaškov

Výkopové práce na diele „Odkanalizovanie dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ začali prebiehať v polovici marca na stavebnom objekte „SS. 05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač“.

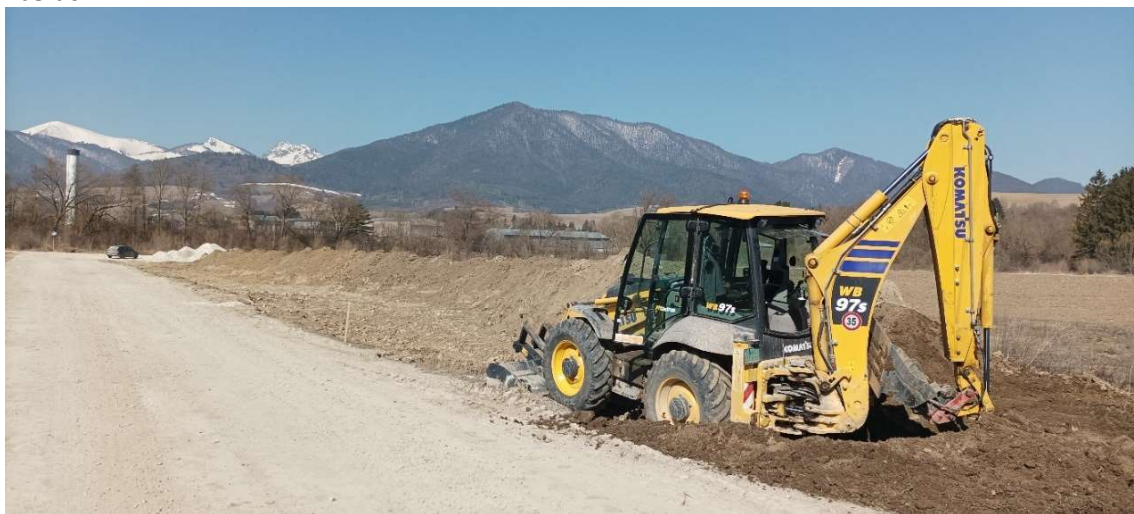

Obr.4: Výkopové práce na SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač



Obr.5: Výkop ryhy pre výtlačné potrubie V1 a jej zabezpečenie pažením (SS.05)



Obr.6: Položenie výtlačného potrubia V1 (SS.05)

Od **23.03.2022** sa pracuje aj na stavebnom objekte „**SS.01 Žaškov, kanalizácia**“. Začalo sa frézovaním na uliciach Lackovská (stoka B10) a Roveň (stoka B12), pokračuje sa ulicami Reko vo (stoka B9), Kozlovská (stoka B11, B11-1) a Majdovská (stoka B12-1).



Obr.7: Zriadené stavenisko v obci Žaškov (SS.01)



Obr.8: Frézovanie miestnej komunikácie v obci Žaškov (SS.01)

Od začiatku apríla sa výkopové práce realizujú aj na stavebnom súbore **SS.02 Párnica, kanalizácia**. Realizovaná je aktuálne stoka C, C4, C4-1, B2-1, B2-3.



Obr.9: Hĺbenie ryhy pre polozenie kanalizačného potrubia v obci Párnica (SS.02)

V sledovanom období sa stavebné práce na stavebnom súbore **SS.02 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač** nevykonávali. Vzhľadom na prebiehajúce pozemkové úpravy v k.ú. obce Oravská Poruba, vznikla požiadavka na posun trasy kanalizačného potrubia do plánovanej komunikácie. Pokynom na zmenu stavebného dozoru bola táto zmena zaznamenaná a posunutá na spracovanie Zhotoviteľovi.
