



Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Bytterecká 2180, 026 80 Dolný Hubín

ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA 3

**Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy –
Žaškov, Párnica, Oravská Poruba,
Veličná**

za obdobie 05/2022 – 07/2022



SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVAK ENVIRONMENT
AGENCY



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia
Európske štrukturálne
a investičné fondy

Projekt:

„Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín. Druh projektu – dopytovo orientovaný.

Základné údaje:

Kód projektu:

310011A105

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1

Prioritná os:

Udržateľné využívane prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita:

Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ:

Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:

Slovenská agentúra životného prostredia

Prijímateľ pomoci:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Časové väzby:

Začiatok výstavby: 12/2021

Koniec výstavby: 12/2023

Celkové oprávnené výdavky:

17 694 957,18 €

Nenávratný finančný príspevok:

15 925 461,46 €

Vlastné zdroje Prijímateľa:

1 769 495,72 €

Zhotoviteľ stavby:

Združenie „ORAVA VSCVH“:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Bratislava

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Banská Štiavnica

VÁHOSTAV – SK, a.s.

Bratislava

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Bratislava

Stavebný dozor:

G – Consult - Ing. Vladimír Gejdoš, Šaľa - HIS

GeMaDe, s.r.o. – Ing. Eugen Dedinský, Nižná - ASD

Realizované stavebné objekty:

SS.01 Žaškov, kanalizácia

SS.02 Párnica, kanalizácia

SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač

SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač

Práce na projekte v sledovanom období:

SS.01 Žaškov, kanalizácia


V sledovanom období bolo položených 2 777,3 m kanalizačného potrubia. Vybudované boli vetvy: A, B, B1, B9, B10, B11, B11-1, B12, B12-1. Budovaných bolo 94 ks kanalizačných prípojok kanalizačných prípojok k rodinným domom, čo predstavuje 419,67m.



Obr. 1: Práce pri budovaní kanalizačných prípojok k rodinným domom v obci Žaškov (SS.01)

V závere sledovaného obdobia je položených 3 206,52 m kanalizačného potrubia z celkových 10 496,50 m (uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje **30,5%** kanalizačného potrubia v obci Žaškov.

Operatívne boli riešené aj zmeny v trasovaní budovanej kanalizácie v záujme vlastníckych práv občanov. Zvolané boli rokovania, kde sa hľadali schodné riešenia.

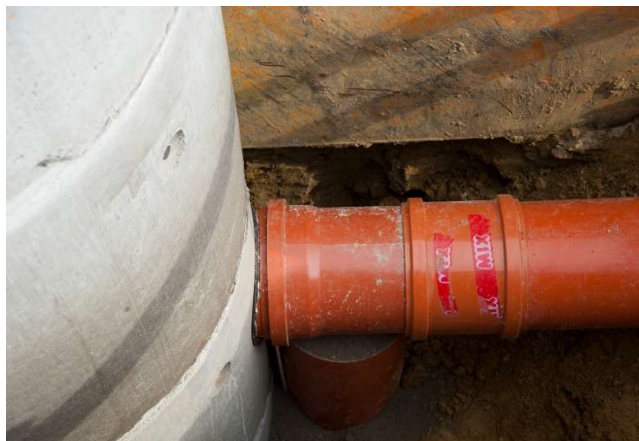

Obr. 2: Osadenie kanalizačnej šachty v obci Žaškov (SS.01)



Obr. 3: Hĺbenie ryhy pre uloženie kanalizačného potrubia a osadenie potrebného pažiacej konštrukcie v obci Žaškov (SS.01)

SS.02 Párnica, kanalizácia

V sledovanom období bolo položených 2 107,76 m kanalizačného potrubia. Budované boli vetvy: C, C4, C4-1, B, B2-2, B2-3, B5. Vybudovaných bolo 69 ks kanalizačných prípojok k rodinným domom, čo predstavuje 311,7m. Výrazným bodom v sledovanom období bol začiatok stavebných prác v štátnej ceste I/70, čomu predchádzalo vybavenie príslušných povolení potrebných pred zásahom do tohto cestného telesa.



Obr. 4: Stavebné práce v štátnej ceste I/70 v obci Párnica (SS.02)

V závere sledovaného obdobia je položených 2 395,55 m kanalizačného potrubia z celkových 6 393,50 m (uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje **37,4%** kanalizačného potrubia v obci Párnica.



Obr. 5: Stavebné práce v štátnej ceste I/70 v obci Párnica (SS.02)

Súčasťou stavebných prác bola aj preložka dažďového odvodnenia v celkovej dĺžke 9,62 m, ktoré bolo odhalené pri trasovaní stoky C. Preložených bolo aj 159,57 m verejného vodovodu, ktorý bol v kolízii s trasovanou kanalizáciou, stokou C4 a C4-1.



Obr. 6: Dažďové odvodnenie objavené počas realizácie technológie pretlaku kanalizačného potrubia, stoka „C“ v obci Párnica (SS.02)

SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač

V sledovanom období bolo položených 3 196,54 m kanalizačného zberača Žaškov – Oravská Poruba. Osadené boli revízne, kalníkové a vzdušниковé šachty. Na uvedenom stavebnom súbore zostáva dobudovať 29 m potrubia vrátane osadenia tlmiačich a kalníkových šácht.



Obr. 7: Stavebné práce - kanalizačný zberač SS.05: polozenie výtlačného potrubia, osadená vzdušnikovú šachta, vybavenie vzdušnikovej šachty

Územím s vybudovaným úsekom kanalizačného zberača prebehla biologická rekultivácia, uvedenie do pôvodného stavu a vyčistenie škody, ktorá nastala jednotlivým užívateľom poľnohospodárskej pôdy.

SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač

V sledovanom období stavebné práce na stavebnom súbore nezačali. Predpokladaný termín je datovaný v mesiacoch august-september, resp. mimo vegetačné obdobie. Prebiehajú však administratívne úkony (Pokyn na zmenu č. 2) potrebné k povoleniu zmeny trasovania kanalizačného potrubia v dôsledku prebiehajúcich pozemkových úprav v k.ú. obce Oravská Poruba. Cieľom je uloženie

kanalizačného potrubia tak, aby jeho trasovaním a ochranným pásmom nebola narušená funkčnosť a usporiadanie riešeného územia.

Čerpacie stanice v sledovanom období neboli predmetom riešenia.

V závere sledovaného obdobia je vybudovaných 37,2% dĺžky kanalizačného potrubia na diele „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“.



Obr. 8: Obhliadka staveniska pracovníkom OVS, a.s. v rámci zabezpečenia BOZP (SS.01)

V Dolnom Kubíne, dňa 10.08.2022

Ing. Zuzana Klimeková
