



**Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.**  
Bytterecká 2180, 026 80 Dolný Hubín

# ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA 7

**Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy –  
Žaškov, Párnica, Oravská Poruba,  
Veličná**

za obdobie 05/2023 – 07/2023



SLOVENSKÁ AGENTÚRA  
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
SLOVAK ENVIRONMENT  
AGENCY



MINISTERSTVO  
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



OPERAČNÝ PROGRAM  
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia  
Európske štrukturálne  
a investičné fondy

## Projekt:

### „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín. Druh projektu – dopytovo orientovaný.

## Základné údaje:

Kód projektu:

**310011A105**

Kód výzvy:

**OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1**

Prioritná os:

**Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry**

Investičná priorita:

**Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek**

Špecifický cieľ:

**Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ**

Riadiaci orgán:

**Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**

Sprostredkovateľský orgán:

**Slovenská agentúra životného prostredia**

Prijímateľ pomoci:

**Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Časové väzby:

**Začiatok výstavby: 12/2021**

**Koniec výstavby: 12/2023**

Celkové oprávnené výdavky:

**17 694 957,18 €**

Nenávratný finančný príspevok:

**15 925 461,46 €**

Vlastné zdroje Prijímateľa:

**1 769 495,72 €**

Zhotoviteľ stavby:

**Združenie „ORAVA VSCVH“:**

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Bratislava

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Banská Štiavnica

VÁHOSTAV – SK, a.s.

Bratislava

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Bratislava

Stavebný dozor:

**G – Consult** - Ing. Vladimír Gejdoš, Šaľa - HIS

**GeMaDe, s.r.o.** – Ing. Eugen Dedinský, Nižná - ASD

Realizované stavebné objekty:

**SS.01 Žaškov, kanalizácia**

**SS.02 Párnica, kanalizácia**

**SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač**

**SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač**

Dňa **09.11.2021** bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru a Zmluvu o poskytnutí služieb asistenta stavebného dozoru.

Dňa **07.12.2021** bola podpísaná **zmluva** so zhotoviteľom stavby **na výkon stavebných prác a dňa 08.12.2021 nadobudla Zmluva o Dielo účinnosť.**

Stavebný dozor v zmysle čl. 8.1. Všeobecných zmluvných podmienok vyhlásil začiatok stavebných prác na Diele „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ na **21.12.2021.**

Dňa **22.02.2022** OVS, a.s. - Objednávateľ stavebných prác, oficiálne odovzdal Stavenisko Zhotoviteľovi – združeniu „ORAVA VSCVH“.

Dňa **11.11.2022** bol uzatvorený **Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo**, premetom ktorého bolo navýšenie jednotkových cien materiálov v dôsledku nepriaznivej situácie na svetovom trhu. Účinnosť nadobudol dňa 15.11.2022.

Navýšenie ZoD nastalo z pôvodnej zmluvnej ceny 14 865 800,88 € na 16 077 130,32 €, teda o **1 211 329,44 € bez DPH** čo predstavuje navýšenie o **8,14%**.

Dňa **22.08.2023** bol uzatvorený **Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo**, premetom ktorého bolo navýšenie jednotkových cien materiálov pre konečné úpravy komunikácií, ktoré neboli predmetom Dodatku č. 1. Navýšenie ZoD nastalo z pôvodnej zmluvnej ceny 14 865 800,88 € na 16 587 387,02 €, teda o **1 721 586,14 € bez DPH** čo predstavuje navýšenie o **12,74%**.

## Práce na projekte v sledovanom období:

### SS.01 Žaškov, kanalizácia

V sledovanom období bolo položených 3 690,90 m kanalizačného potrubia. Pracovalo sa na kanalizačných vetvách B, B3, B5, C2, C3, C4, C1-2-4, C1-2-1, C1-2-2, A, A0, A1, C1-2-3, B8-1, B9-1, B12-1, B8-1, A-a, B2-3, B2-3-2, B5, B5-1, C3-1, B9, B9-2, B, B8, C1-2-2, B8-1, B8-1-3. Budovaných bolo 140 ks kanalizačných prípojk k rodinným domom, čo predstavuje 904,88 m.



**Obr. 1: Budovanie kanalizácie - stavebné práce v miestnej komunikácii v obci Žaškov (SS.01)**




**Obr. 2: Vibračné zhutňovanie zemin - spätný zásyp v obci Žaškov (SS.01)**

K dátumu 31.07.2023 je položených 10 392,83 m kanalizačného potrubia z celkových 10 746 m (uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje **99,21%** kanalizačného potrubia v obci Žaškov. V sledovanom období bolo taktiež položených 1 447,01 m kanalizačného potrubia, ktoré bolo naprojektované dodatočne pre novovzniknuté lokality.

V sledovanom období boli zrealizované NN prípojky pre čerpace stanice ČS.05 a ČS.06.

### **SS.02 Párnica, kanalizácia**

V sledovanom období bolo položených 1 239,57 m kanalizačného potrubia. Budované boli vetvy: B, B3, B6, B, B2-3, C4-1-1, B2-3, V1. Vybudovaných bolo 50 ks kanalizačných prípojok k rodinným domom, čo predstavuje 436,17m.

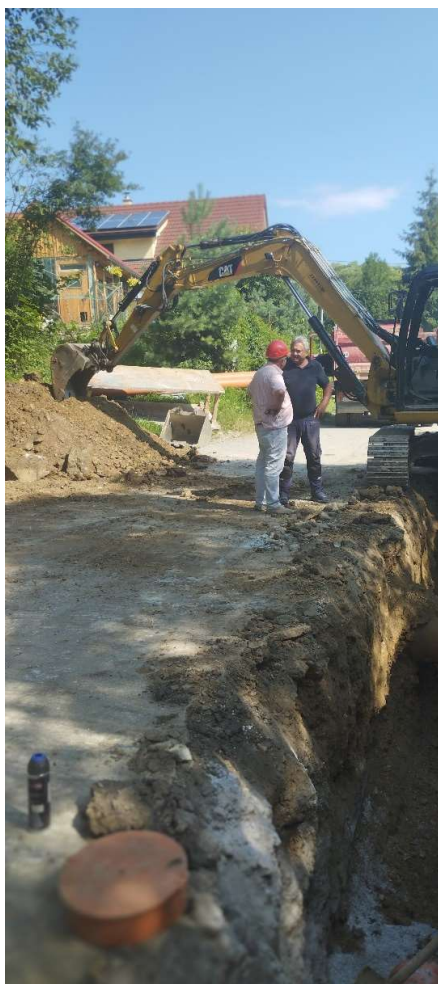



**Obr. 3 Budovanie verejnej kanalizácie v obci Párnica (SS.02)**

V závere sledovaného obdobia je položených 6 750,73m kanalizačného potrubia z celkových 7 757,5 m (uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje **87,02%** kanalizačného potrubia v obci Párnica. V sledovanom období bolo taktiež položených 348,07 m kanalizačného potrubia, ktoré bolo naprojektované dodatočne pre novovzniknuté lokality.

V sledovanom období boli zrealizované NN prípojky pre čerpace stanice ČS.07 a ČS.08.

Začiatkom sledovaného obdobia bolo vybudované aj výtlačného potrubia V1 popod rieku Orava. Princíp spočíval v riadenom vŕtaní pilotného vrtu, rozšírení vrtu a následnom zatiahnutí chráničky.

#### **SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač**

V sledovanom období na stavebnom súbore SS.05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač neprebíhali. V súčasnosti je položených 3 690m z celkových 3 719m, čo predstavuje **99,2%**. Zostáva dobudovať 29 m potrubia vrátane osadenia tlmiačich a kalníkových šácht.


V sledovanom období bola zrealizovaná NN prípojka pre čerpaciu stanicu ČS.04.

#### **SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač**

V sledovanom období bolo položených 462,18m kanalizačného potrubia a zrealizovaná bola NN prípojka pre čerpaciu stanicu ČS.02.



**Obr.4.1: Osádzanie čerpacej stanice - ČS.02 v obci Oravská Poruba (SS.07)**

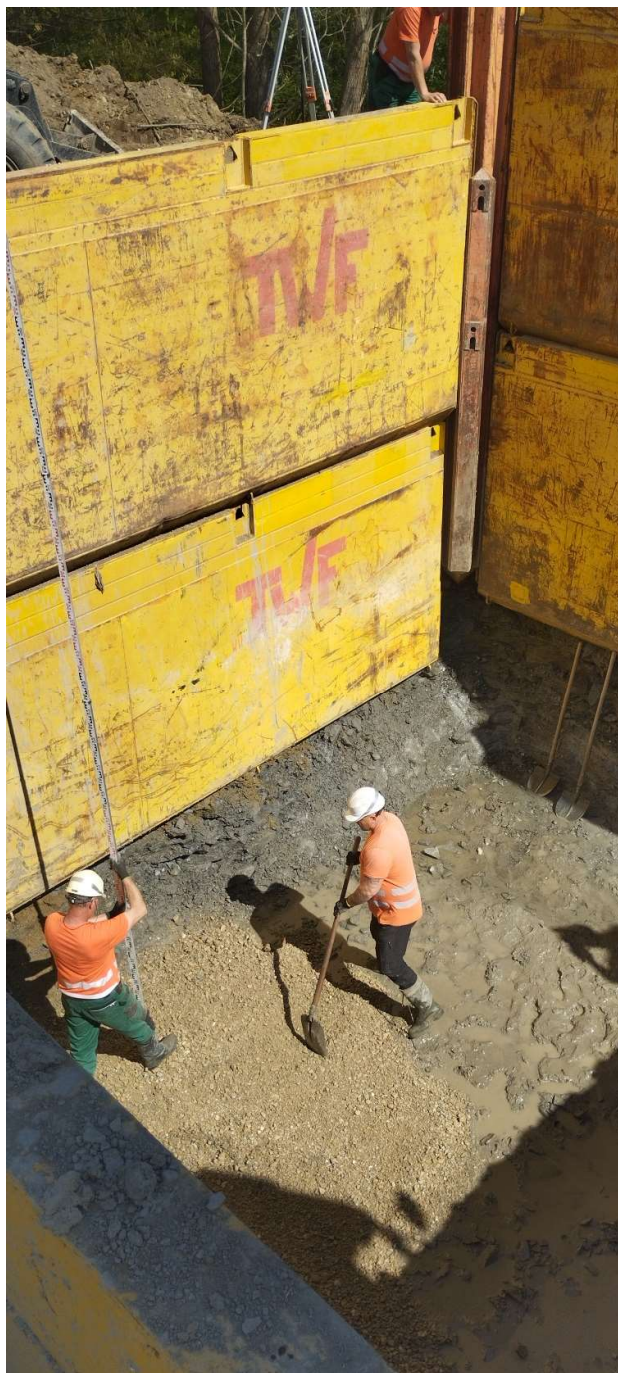

**Obr.4.2: Osádzanie čerpacej stanice - ČS.02 v obci Oravská Poruba (SS.07)**



**Obr.5: Obr. 3 Budovanie verejnej kanalizácie (SS.07)**

#### Časť Diela vybudovala OVS, a.s.:

Rozhodnutím MŽP SR zo dňa 21. 03. 2016 bola žiadosť o NFP neschválená. Dôvodom neschválenia bol nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených v rámci výzvy.

Na základe týchto skutočností Oravská vodárenská spoločnosť v roku 2016 rozhodla, že bude práce realizovať z vlastných zdrojov. Výstavba časti diela (**výtlačné potrubie SS.07 Oravská Poruba-Dolný Kubín, kanalizačný zberač**) začala v **07/2017**. Projekt bol budovaný v zmysle stavebného povolenia a dokumentácie pre stavebné povolenie. Položených bolo 986m výtlačného potrubia. Z uvedeného vyplýva, že v závere sledovaného obdobia je **SS.07 Oravská Poruba-Dolný Kubín, kanalizačný zberač** vybudovaný na **98,39%** projektovanej dĺžky kanalizačného potrubia.

#### Prestavanosť jednotlivých stavebných objektov Diela k 07/2023:

- **SS.01 Žaškov, kanalizácia - 99,21% (gravitačné potrubie)**
- **SS.02 Párnica, kanalizácia - 87,02% (gravitačné + výtlačné potrubie)**
- **SS.05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač - 99,2% (výtlačné potrubie)**
- **SS.07 Oravská Poruba - Dolný Kubín, kanalizačný zberač - 98,39% z celkovej projektovanej dĺžky kanalizačného potrubia (v rátane už vybudovanej časti - investícia OVS, a.s.: 2017-2019) (gravitačné + výtlačné potrubie)**





*Obr. 6: Obhliadka staveniska pracovníkom OVS, a.s. v rámci zabezpečenia BOZP (SS.01 a SS.02)*

V súčasnosti je položených **28,09 km** z celkových **30,003 km**. V závere sledovaného obdobia je vybudovaných **93,63%** dĺžky kanalizačného potrubia na diele „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“.

V Dolnom Kubíne, dňa 09.08.2023
